


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五	六	日	2020年2月17日	一	二	三	四	五	六	日	2020
1	1	启动	4 个工作日	2020年2月15日	2020年2月19日		王立雨, 弥思盈												
2		任命项目经理	1 个工作日	2020年2月15日	2020年2月15日														
3		组件核心团队	1 个工作日	2020年2月16日	2020年2月16日		王立雨												
4		分析干系人利益	1 个工作日	2020年2月17日	2020年2月17日		王立雨												
5		制定项目章程	1 个工作日	2020年2月18日	2020年2月18日	2, 3, 4	王立雨												
6		启动大会	1 个工作日	2020年2月19日	2020年2月19日	5	王立雨, 弥思盈												
7		规划	16 个工作日	2020年2月20日	2020年3月12日														
8		规划范围	10 个工作日	2020年2月20日	2020年3月4日														
9		制定需求说明书	10 个工作日	2020年2月20日	2020年3月4日	6	弥思盈												
10		界面设计	5 个工作日	2020年2月21日	2020年2月27日	9	张书慧												
11		详细设计说明书	5 个工作日	2020年2月21日	2020年2月27日	9	张书慧												
12		范围说明书	3 个工作日	2020年2月21日	2020年2月25日	9	王立雨												
13		创建WBS	2 个工作日	2020年2月22日	2020年2月24日	10, 11, 12	王立雨												
14		形成范围基准	1 个工作日	2020年2月23日	2020年2月23日	13	王立雨												
15		规划时间	5 个工作日	2020年2月26日	2020年3月3日														
16		排列工作包顺序	1 个工作日	2020年2月26日	2020年2月26日	14	王立雨												
17		估算资源	2 个工作日	2020年2月27日	2020年2月28日	16	王立雨												
18		估算持续时间	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	王立雨												
19		制定进度计划	1 个工作日	2020年2月29日	2020年2月29日	18	王立雨												
20		形成进度基准	1 个工作日	2020年3月1日	2020年3月1日	19	王立雨												
21		规划成本	3 个工作日	2020年3月4日	2020年3月6日														
22		项目成本估算	3 个工作日	2020年3月4日	2020年3月6日	20	王立雨												
23		项目预算	2 个工作日	2020年3月5日	2020年3月6日	22	王立雨												
24		形成范围基准	1 个工作日	2020年3月6日	2020年3月6日	23	王立雨												
25		规划质量	7 个工作日	2020年2月26日	2020年3月5日														
26		制定测试计划	2 个工作日	2020年2月26日	2020年2月27日	14	薛明星												
27		制定测试用例	6 个工作日	2020年2月27日	2020年3月5日	26	薛明星												
28		规划人力资源	3 个工作日	2020年2月28日	2020年3月3日														
29		制定人力资源计划	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	王立雨												
30		指定人员配备管理计划	2 个工作日	2020年3月2日	2020年3月3日	29	王立雨												
31		规划沟通	2 个工作日	2020年3月1日	2020年3月2日														
32		制定沟通管理计划	2 个工作日	2020年3月1日	2020年3月2日	30	王立雨												

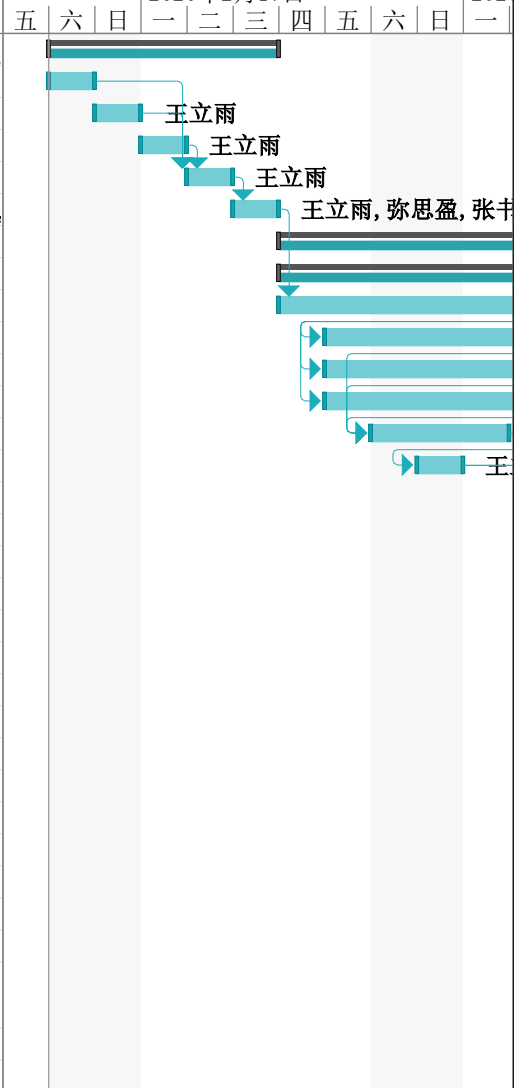

项目：doIT 日期：2020年4月26日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五	六	日	2020年2月17日	一	二	三	四	五	六	日	2020
33		规划采购	6 个工作日	2020年2月28日	2020年3月6日														
34		自制外购分析	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	王立雨												
35		制定采购文件	5 个工作日	2020年2月29日	2020年3月5日	34	王立雨												
36		规划风险	3 个工作日	2020年3月7日	2020年3月10日														
37		识别风险	1 个工作日	2020年3月7日	2020年3月7日	15, 21, 25, 28	王立雨												
38		风险分析	1 个工作日	2020年3月8日	2020年3月8日	37	王立雨												
39		制定风险登记册	1 个工作日	2020年3月11日	2020年3月11日	38	王立雨												
40		规划整合	1 个工作日	2020年3月12日	2020年3月12日	39	王立雨												
41		执行与监控	82 个工作日	2020年3月13日	2020年7月6日														
88		收尾	62 个工作日	2020年7月7日	2020年9月30日		王立雨, 任紫萱												
92																			
93																			
94							任紫萱, 王立雨												
95							王立雨, 任紫萱												
96							任紫萱, 王立雨												
97							任紫萱, 王立雨												
98							任紫萱, 王立雨												
99							任紫萱, 王立雨												
100							王立雨, 任紫萱												
101																			
102																			
103							任紫萱, 王立雨												
104							任紫萱, 王立雨												
105							任紫萱, 王立雨												
106							任紫萱, 王立雨												
107							任紫萱, 王立雨												
108																			
109							弥思盈, 任紫萱												
110							弥思盈, 任紫萱												
111							弥思盈, 任紫萱												
112							弥思盈, 任紫萱												
113							弥思盈, 任紫萱												
114							弥思盈, 任紫萱												

项目：doIT

日期：2020年4月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五	六	日	2020年2月17日							2020
											一	二	三	四	五	六	日	一
115																		
116							任紫萱, 薛明星											
117							任紫萱, 薛明星											
118							任紫萱, 薛明星											
119							任紫萱, 薛明星											
120							任紫萱, 薛明星											
121							任紫萱, 薛明星											
122							任紫萱, 薛明星											
123							张书慧											
124							王立雨, 弥思盈											
125							王立雨, 弥思盈											
126							弥思盈, 任紫萱											
127																		
128							王立雨											
129							王立雨											
130							王立雨											
131																		
132							王立雨, 薛明星											
133							弥思盈, 任紫萱											
134							弥思盈, 任紫萱											
135							项目经理											
136							弥思盈, 任紫萱											
137																		
138							弥思盈, 王立雨											
139							王立雨											
140							弥思盈, 任紫萱											

项目：doIT

日期：2020年4月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务









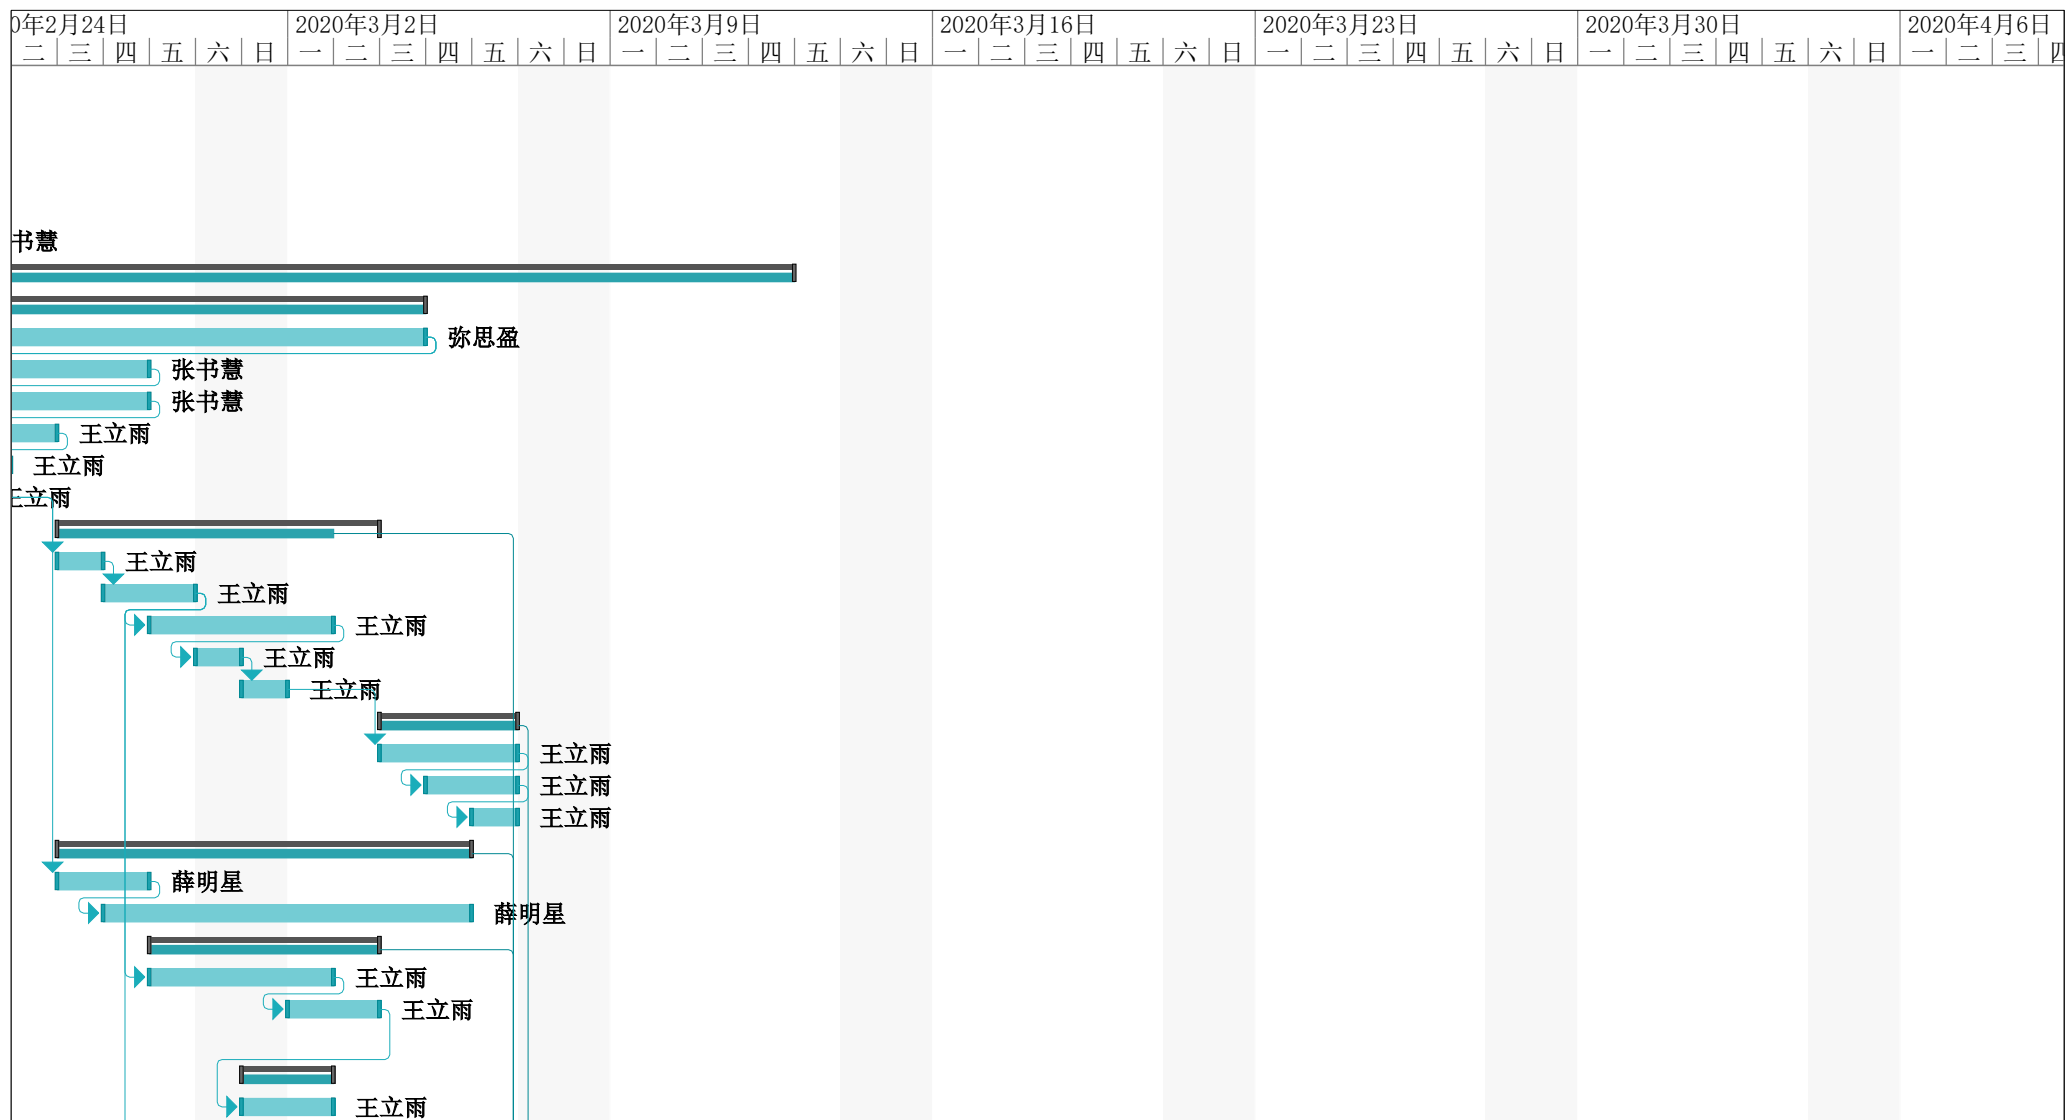










外部里程碑


最后期限

进度


手动进度



项目: doIT 日期: 2020年4月26日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

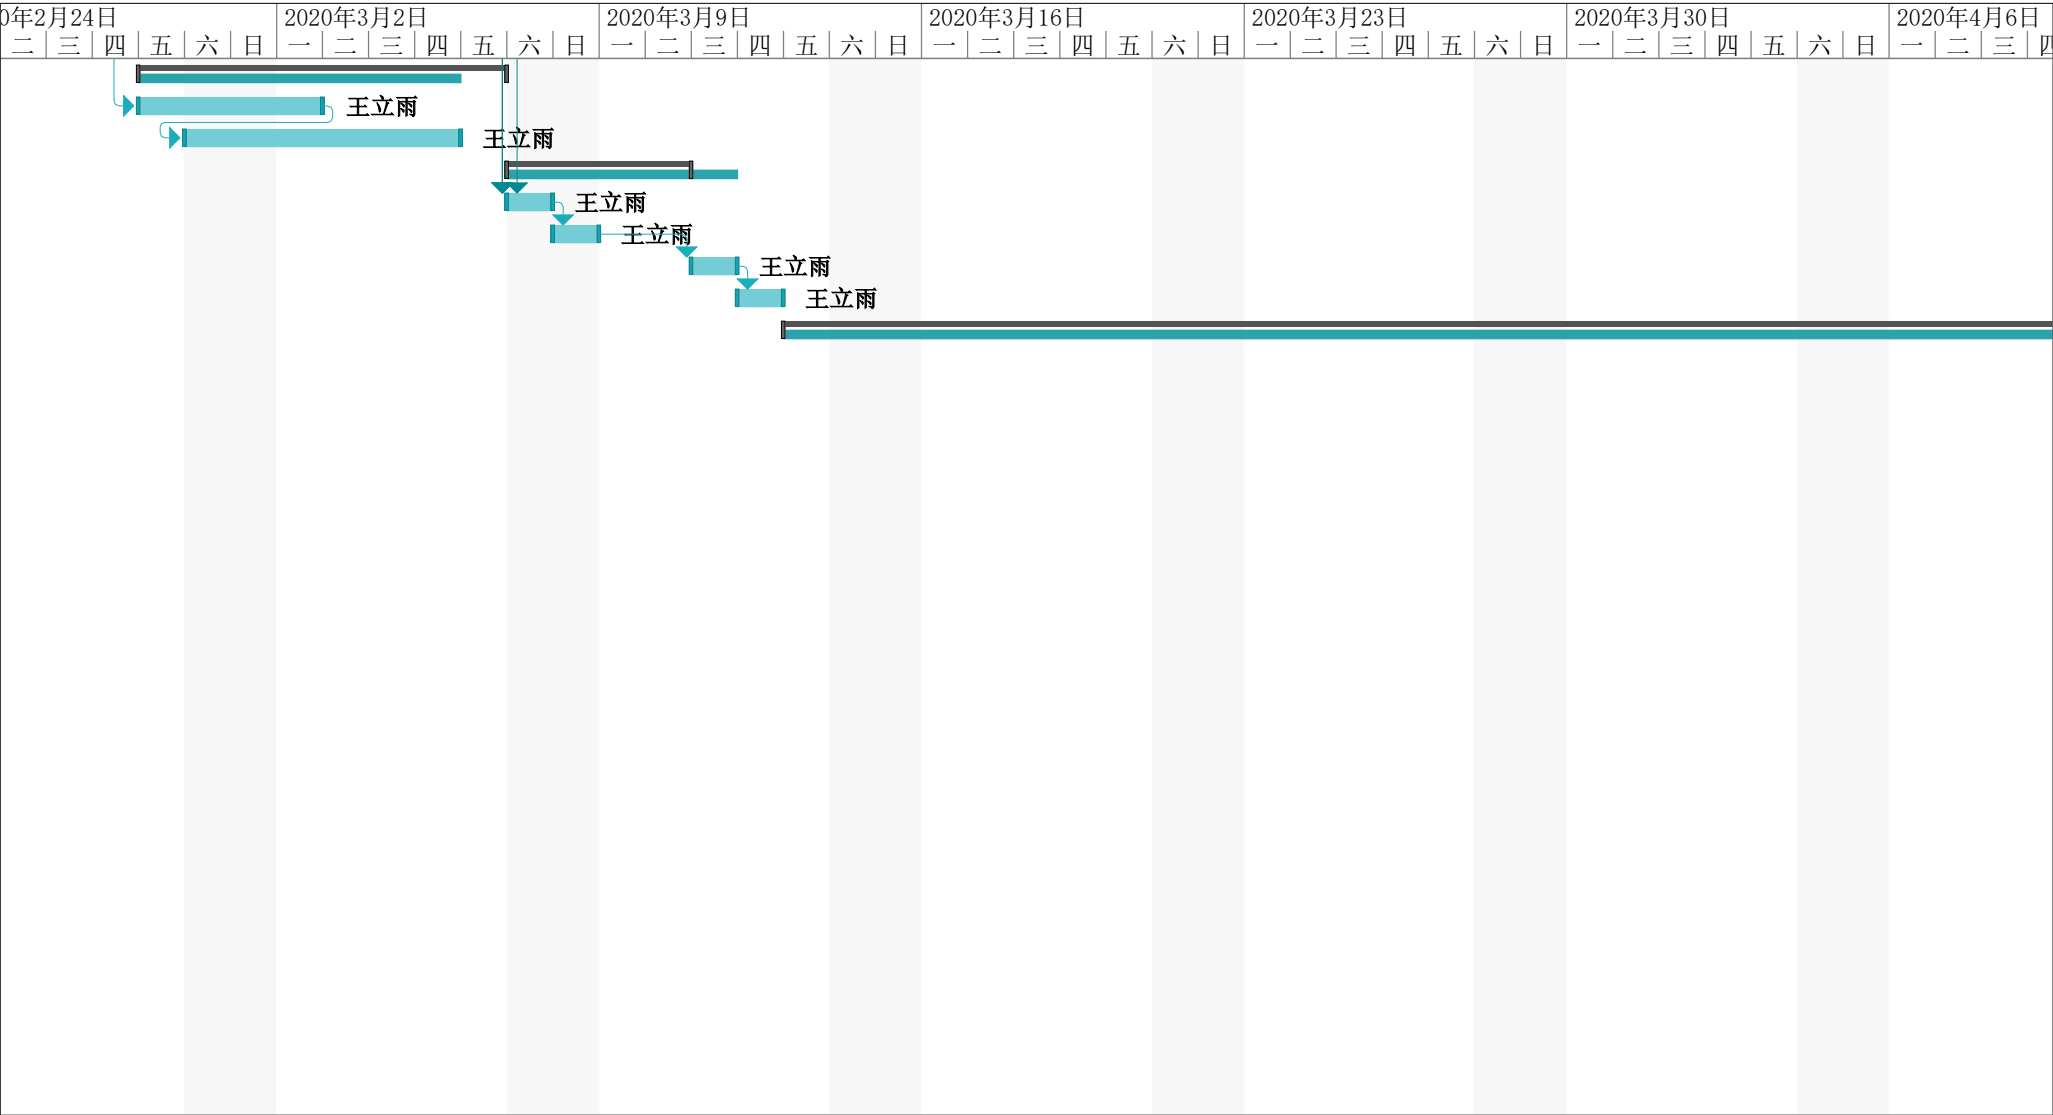

项目：doIT 日期：2020年4月26日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

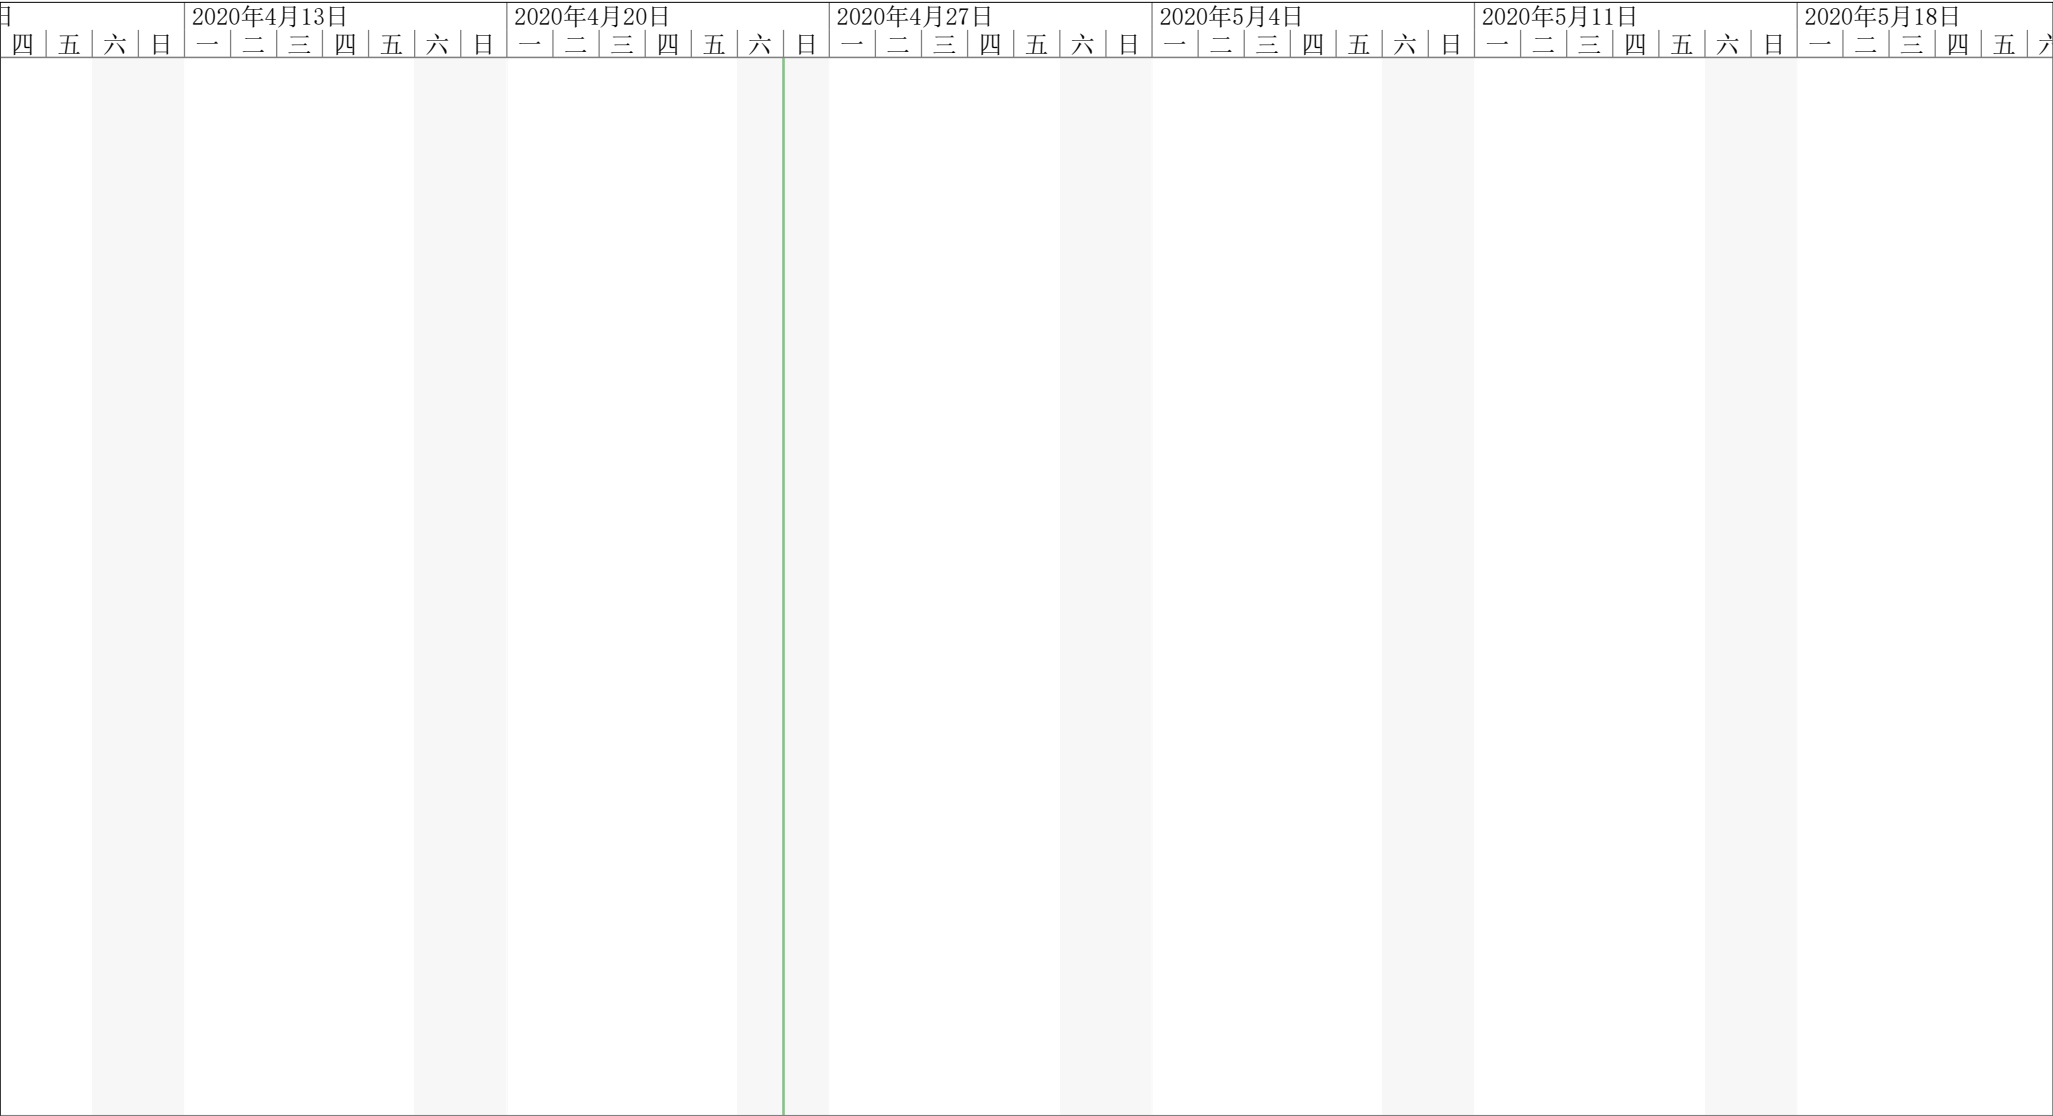

项目：doIT
日期：2020年4月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

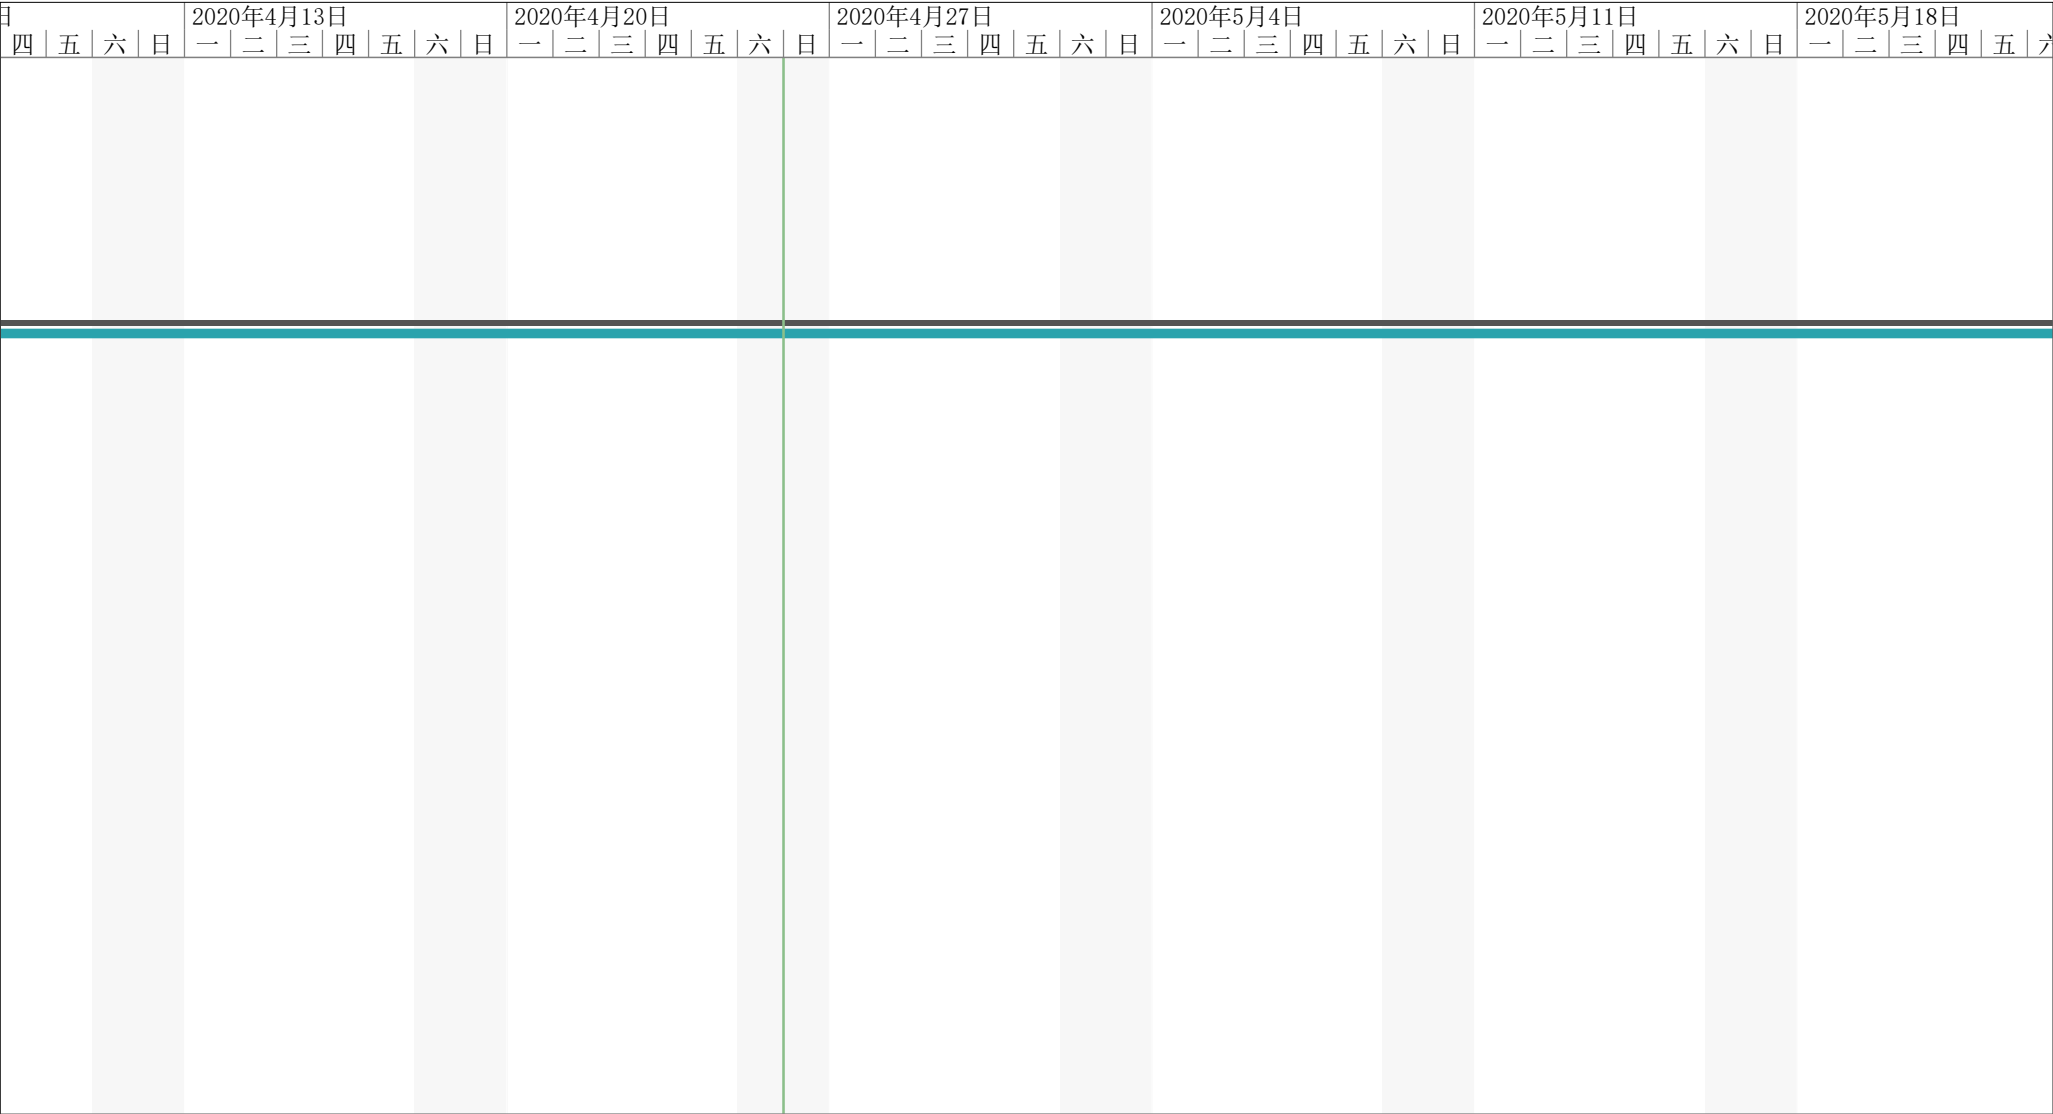

项目：doIT
日期：2020年4月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：doIT
日期：2020年4月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

2020年5月25日							2020年6月1日							2020年6月8日							2020年6月15日							2020年6月22日							2020年6月29日							20									
六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一

项目：doIT
日期：2020年4月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 11 页

		2020年5月25日							2020年6月1日							2020年6月8日							2020年6月15日							2020年6月22日							2020年6月29日							20
六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一
<div>项目：doIT</div> <div>日期：2020年4月26日</div>		任务	<div></div>		非活动任务	<div></div>		手动摘要总成	<div></div>		外部里程碑	<div></div>																																
		拆分	<div></div>		非活动里程碑	<div></div>		手动摘要	<div></div>		最后期限	<div></div>																																
		里程碑	<div></div>		非活动摘要	<div></div>		仅开始时间	<div></div>		进度	<div></div>																																
		摘要	<div></div>		手动任务	<div></div>		仅完成时间	<div></div>		手动进度	<div></div>																																
		项目摘要	<div></div>		仅工期	<div></div>		外部任务	<div></div>																																			
第 12 页																																												



项目：doIT
日期：2020年4月26日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

2020年7月6日							2020年7月13日							2020年7月20日							2020年7月27日							2020年8月3日							2020年8月10日							2020年8月17日		
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三							
<div></div>																																												

项目: doIT
日期: 2020年4月26日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

2020年7月6日							2020年7月13日							2020年7月20日							2020年7月27日							2020年8月3日							2020年8月10日							2020年8月17日		
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三							

月17日 三 四 五 六 日							2020年8月24日 一 二 三 四 五 六 日							2020年8月31日 一 二 三 四 五 六 日							2020年9月7日 一 二 三 四 五 六 日							2020年9月14日 一 二 三 四 五 六 日							2020年9月21日 一 二 三 四 五 六 日							2020年9月28日 一 二 三 四 五 六 日																				
项目：doIT 日期：2020年4月26日							任务	<div></div>	非活动任务	<div></div>	手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑	<div></div>																																																
							拆分	<div></div>	非活动里程碑	<div></div>	手动摘要	<div></div>	最后期限	<div></div>																																																
							里程碑	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>																																																
							摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>																																																
							项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>																																																		
第 18 页																																																														
